

Valor Ganado. Tiempo de dedicación

En este documento se presentan los valores que representan el tiempo de dedicación estimado en el documento de Organización del Proyecto, comparado con el tiempo total dedicado a la realización del Proyecto *Juice in time*.

En la Figura 1 se puede ver el gráfico representado por semanas, el tiempo de dedicación. Tal y como se muestra en la leyenda, el color naranja representa el tiempo total dedicado, frente al azul, que representa el tiempo teórico o estimado.

Fácilmente se puede visualizar que la dedicación ha sido mayoritariamente inferior excepto por dos semanas puntuales en el que la dedicación ha sido igual o superior a la estimada. Sin embargo, hemos asegurado todas las entregas que debíamos realizar, dedicando menos tiempo del que se había considerado en un inicio. Es por eso que concluimos que esta diferencia en los resultados, la valoramos de forma positiva.

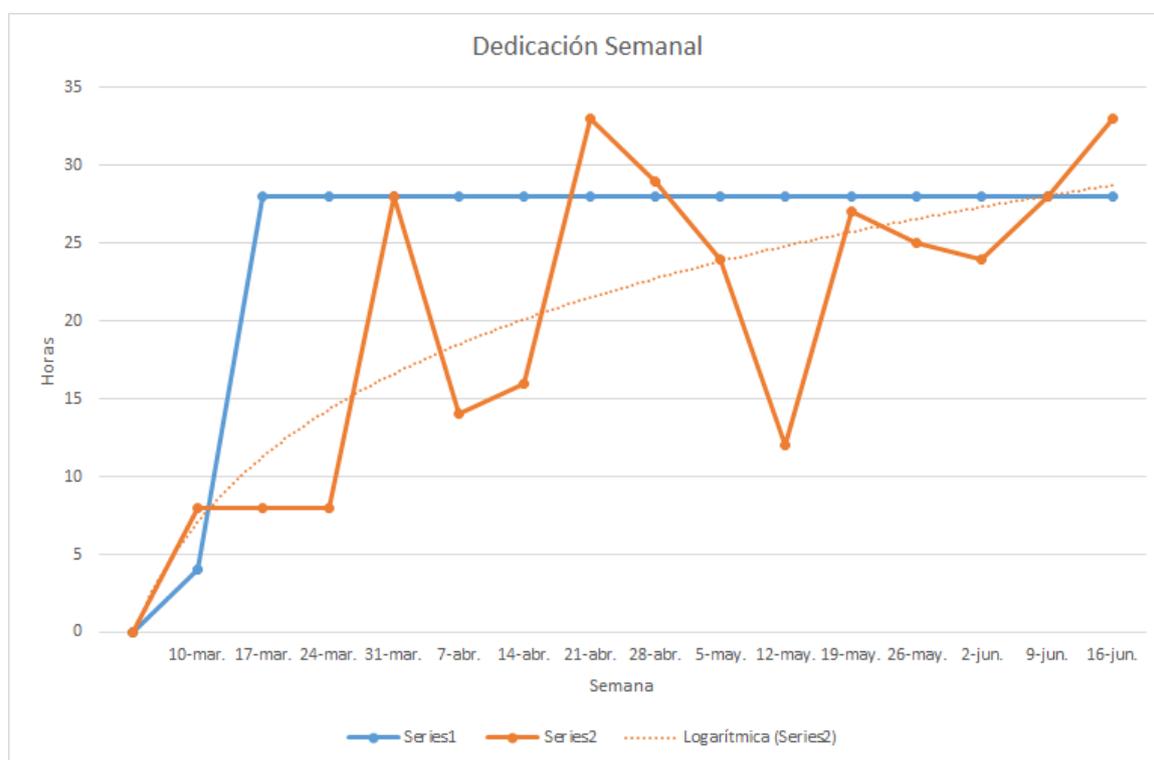


Figure 1: Grafico Valor Ganado - Tiempo de dedicación

Por otra parte, la Figura 2, equivale a la tabla de valores utilizada para representar el gráfico mencionado en la explicación anterior. Se puede visualizar fácilmente, que la dedicación real total es ligeramente superior al tiempo estimado de dedicación definido al inicio de este proyecto.

Consideramos que el tiempo invertido nos ha sido favorable para poder organizarnos las partes del proyecto. Hemos aprovechado las reuniones para definir las partes comunas, de esta manera, a partir de ahora vamos a poder trabajar en paralelo. Y es por eso que consideramos que nuestro ritmo de trabajo es correcto acorde con los plazos de entrega de las distintas fases del proyecto.

	HITO	Tiempo total Estimado	Tiempo total Dedicado	NF	LG	AM	MV
10-mar.	Inicio proyecto	0	0				
17-mar.	1a presentación idea	4	8	2	2	2	2
24-mar.		28	8	2	2	2	2
31-mar.		28	8	2	2	2	2
7-abr.		28	28	7	6	7	8
14-abr.	Entrega Org. del proyecto	28	14	4	3	4	3
21-abr.		28	16	4	4	4	4
28-abr.		28	33	8	9	8	8
5-may.	1a tutoría con J. Sardà	28	29	7	8	7	7
12-may.	1a tutoría con J. Mussons	28	24	6	6	6	6
19-may.		28	12	3	3	3	3
26-may.	EDT + Definición Cronograma	28	27	7	6	7	7
2-jun.	2ª Tutoría J. Mussons	28	25	6	5	6	8
9-jun.		28	24	6	6	6	6
16-jun.		28	28	7	7	7	7
20-jun	Actualización Wix: Bloques 4,5,6,10,13	28	33	7	8	9	9
Suma Total		396	317				

Figure 2: Tabla de valores

Hasta fecha de hoy, día 20 de Junio, concluimos que nuestro avance es correcto según lo que habíamos planeado. Excepto por dudas que tenemos en documentos del proyecto técnico, hemos actualizado el <https://yourfastjuice.wixsite.com/juiceintime/> con la documentación prevista. Hasta fecha de hoy, hemos realizado los siguientes apartados:

- 4/ Definición del Proyecto
- 5/ Plan de Gestión del Alcance
- 6/ Cronograma
- 10/ Gestión de la comunicación
- 13/ Gestión de los interesados

Por otra parte, los apartados que estamos trabajando previstos para el día 25 son:

- 7/ Gestión de los costes – Planificación de recursos
- 9/ Gestión de los RRHH

Finalmente, nos quedará por definir:

- 8/ Gestión de la Calidad
- 11/ Gestión de los riesgos
